
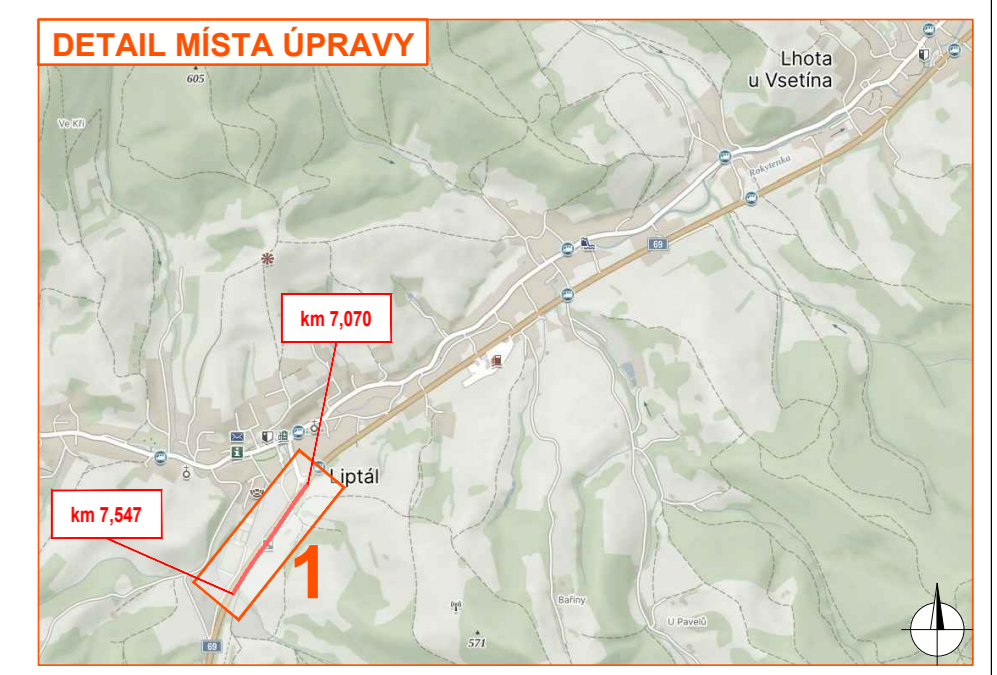


PRACOVNÍ MÍSTO
 - délka pracovního místa max. 477 m
 - frézování stávajícího povrchu
 - pokládka nových asfaltových vrstev
 - doprava řízena kyvadlové SSZ
 - v pracovní době budou vozidla zastavována proškolenými osobami s vysíláčkami



- Legenda:**
- - pracovní místo
 - dokončený úsek
 - P2 - navržené přechodné vislé dopravní značení
 - P2 - stávající vislé dopravní značení
 - P2 - zrušené/přesunutě stávající vislé dopravní značení
 - P2 - již stanovené přechodné dopravní značení
 - P2 - proškolená osoba zastávající vozidla

Situace byla upravena dle stanoviska PČR, DI Vsetín ze dne 24. 8. 2023, Č.j. KRPZ-89315-3/ČJ-2023-151506.

Souhlasíme s přechodnou úpravou, uzavírkou a zvláštním užíváním pozemní komunikace. V souladu s ustanovením § 36 odst. 3 zák. č. 500/2004 Sb. Správního řádu se vzdáváme práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.

Dopravní značení, které bude v rozporu s přechodným dopravním značením bude dočasně zneplatněno.

VYPRACOVAL	ZAVADIL	<i>Zavádil</i>	NVB LINE	
KONTROLOVAL	JANÁTA	<i>Janáta</i>		
DOPLNIL	KÁSPAR	<i>Káspár</i>	NVB LINE s.r.o. Cukrovar 716 768 21 Kvasice www.nvbline.cz zavadi@nbvline.cz tel: 778 973 109	
INVESTOR	REDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR			
ZHOTOVITEL	SWIETELSKÝ stavební s.r.o.			
STAVBA	SILNICE I/69 LHOTA U VSETÍNĚ - LIPTÁL			
VÝKRES	DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ - III. ETAPA - část A		DATUM	24. 8. 2023
1100 x 297	PŘECHODNÁ ÚPRAVA PROVOZU		NAŠE ZN.	ZK-23-1037

1
