


**PRACOVNÍ MÍSTO**  
 - délka pracovního místa max. 477 m  
 - frézování stávajícího povrchu  
 - pokládka nových asfaltových vrstev  
 - doprava řízena kyvadlové SSZ  
 - v pracovní době budou vozidla zastavována proškolenými osobami s vysílačkami

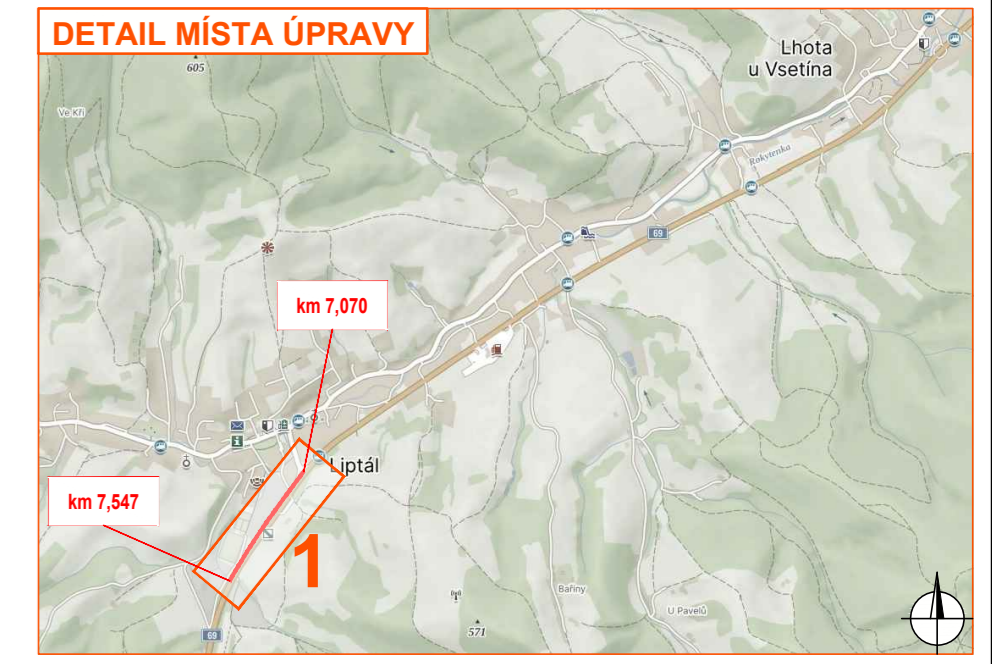

- Legenda:**
- pracovní místo
  - dokončený úsek
  - navržené přechodné vodorovné dopravní značení
  - P2 - navržené přechodné svislé dopravní značení
  - P2 - stávající svislé dopravní značení
  - P2 - zrušené/přesunuté stávající svislé dopravní značení
  - P2 - již stanovené přechodné dopravní značení
  - proškolená osoba zastávající vozidla

**Situace byla upravena dle stanoviska PČR, DI Vsetín ze dne 24. 8. 2023, Č.j. KRPZ-89315-3/ČJ-2023-151506.**

Souhlasím s přechodnou úpravou, uzavírkou a zvláštním užíváním pozemní komunikace. V souladu s ustanovením § 36 odst. 3 zák. č. 500/2004 Sb. Správního řádu se vzdávám práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.

Dopravní značení, které bude v rozporu s přechodným dopravním značením bude dočasně zneplatněno.

VYPRACOVAL	ZAVADIL	<i>Zaváděcí</i>	<p>NVB LINE s.r.o.                  Cukrovar 716                  768 21 Kvasice                  www.nvblne.cz                  zavadi@nvblne.cz                  tel.: 778 973 109</p>
KONTROLOVAL	JANÁTA	<i>Janáta</i>	
DOPLNIL	KÁSPAR	<i>Káspár</i>	
INVESTOR	REDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR		
ZHOTOVITEL	SWIETELSKÝ stavební s.r.o.		
STAVBA	SILNICE I/69 LHOTA U VSETÍNĀ - LIPTÁL		
VÝKRES	DOPRAVNĚ INŽENYRSKÁ OPATŘENÍ		
1100 x 297	- III. ETAPA - část B		
PŘECHODNÁ ÚPRAVA PROVOZU			

**DATUM** 24. 8. 2023  
**NAŠE ZN.** ZK-23-1037

1
